

可燃物処理施設建設工事の進捗状況について

1 着工前後対比

【平成 29 年 11 月（着工前）】




【令和 3 年 4 月上旬】



2 建設工事の状況


【炉室エリアごみホッパ取込状況】

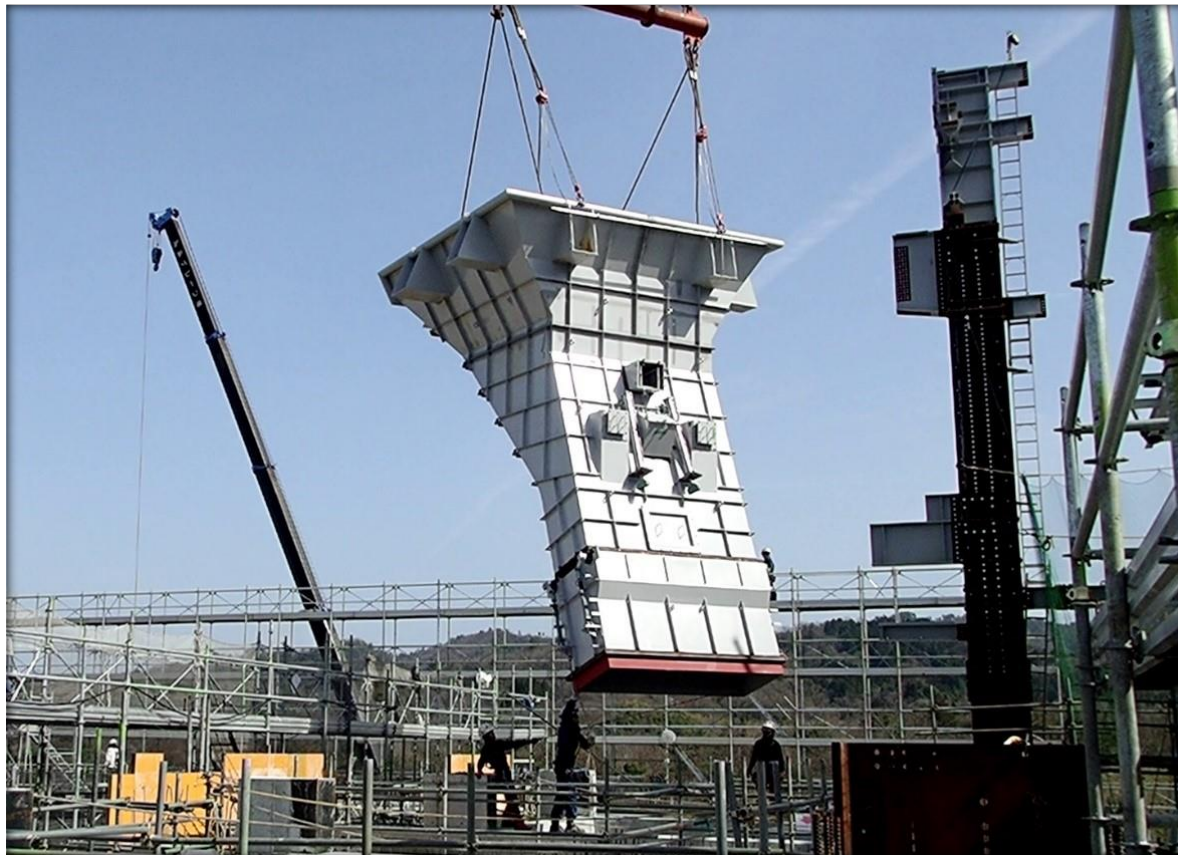

【炉室エリアごみホッパ設置完了】




【排ガス処理エリア建築工事】

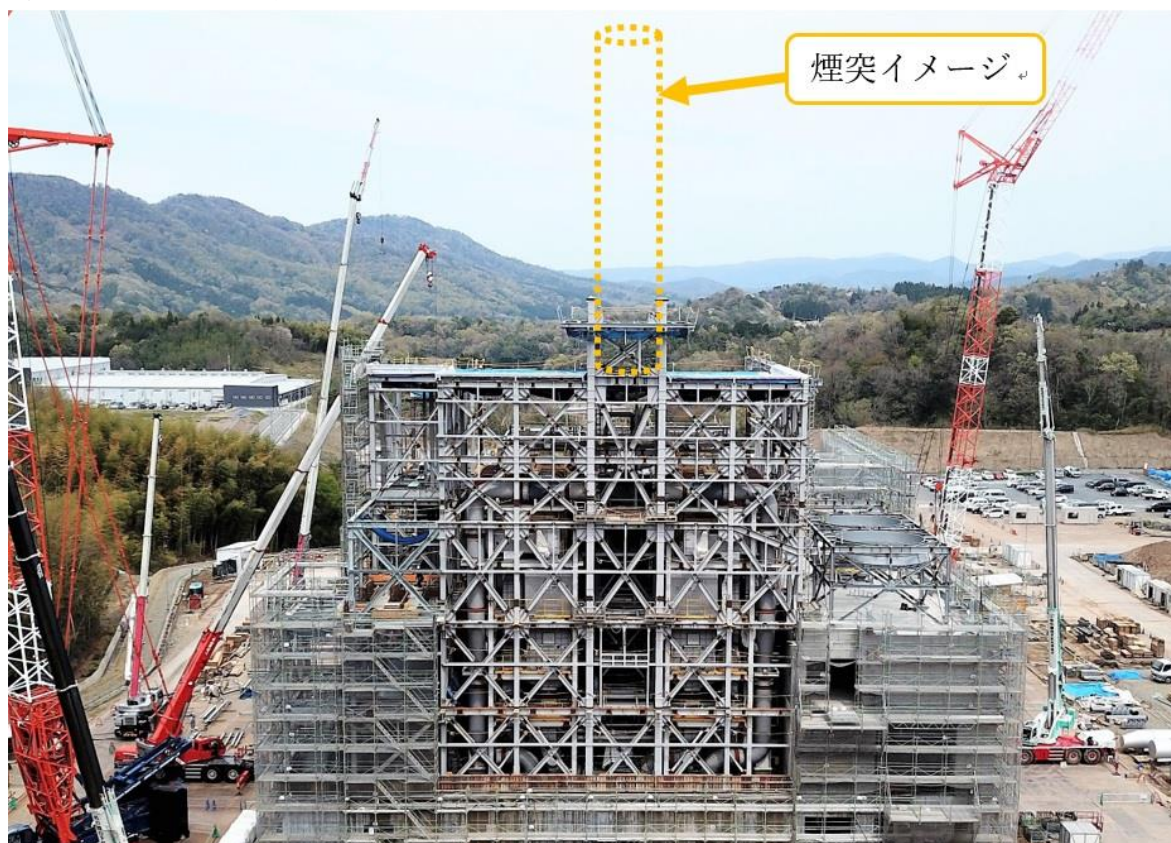

【排ガス処理エリア建築工事(別角度より)】



全体スケジュール

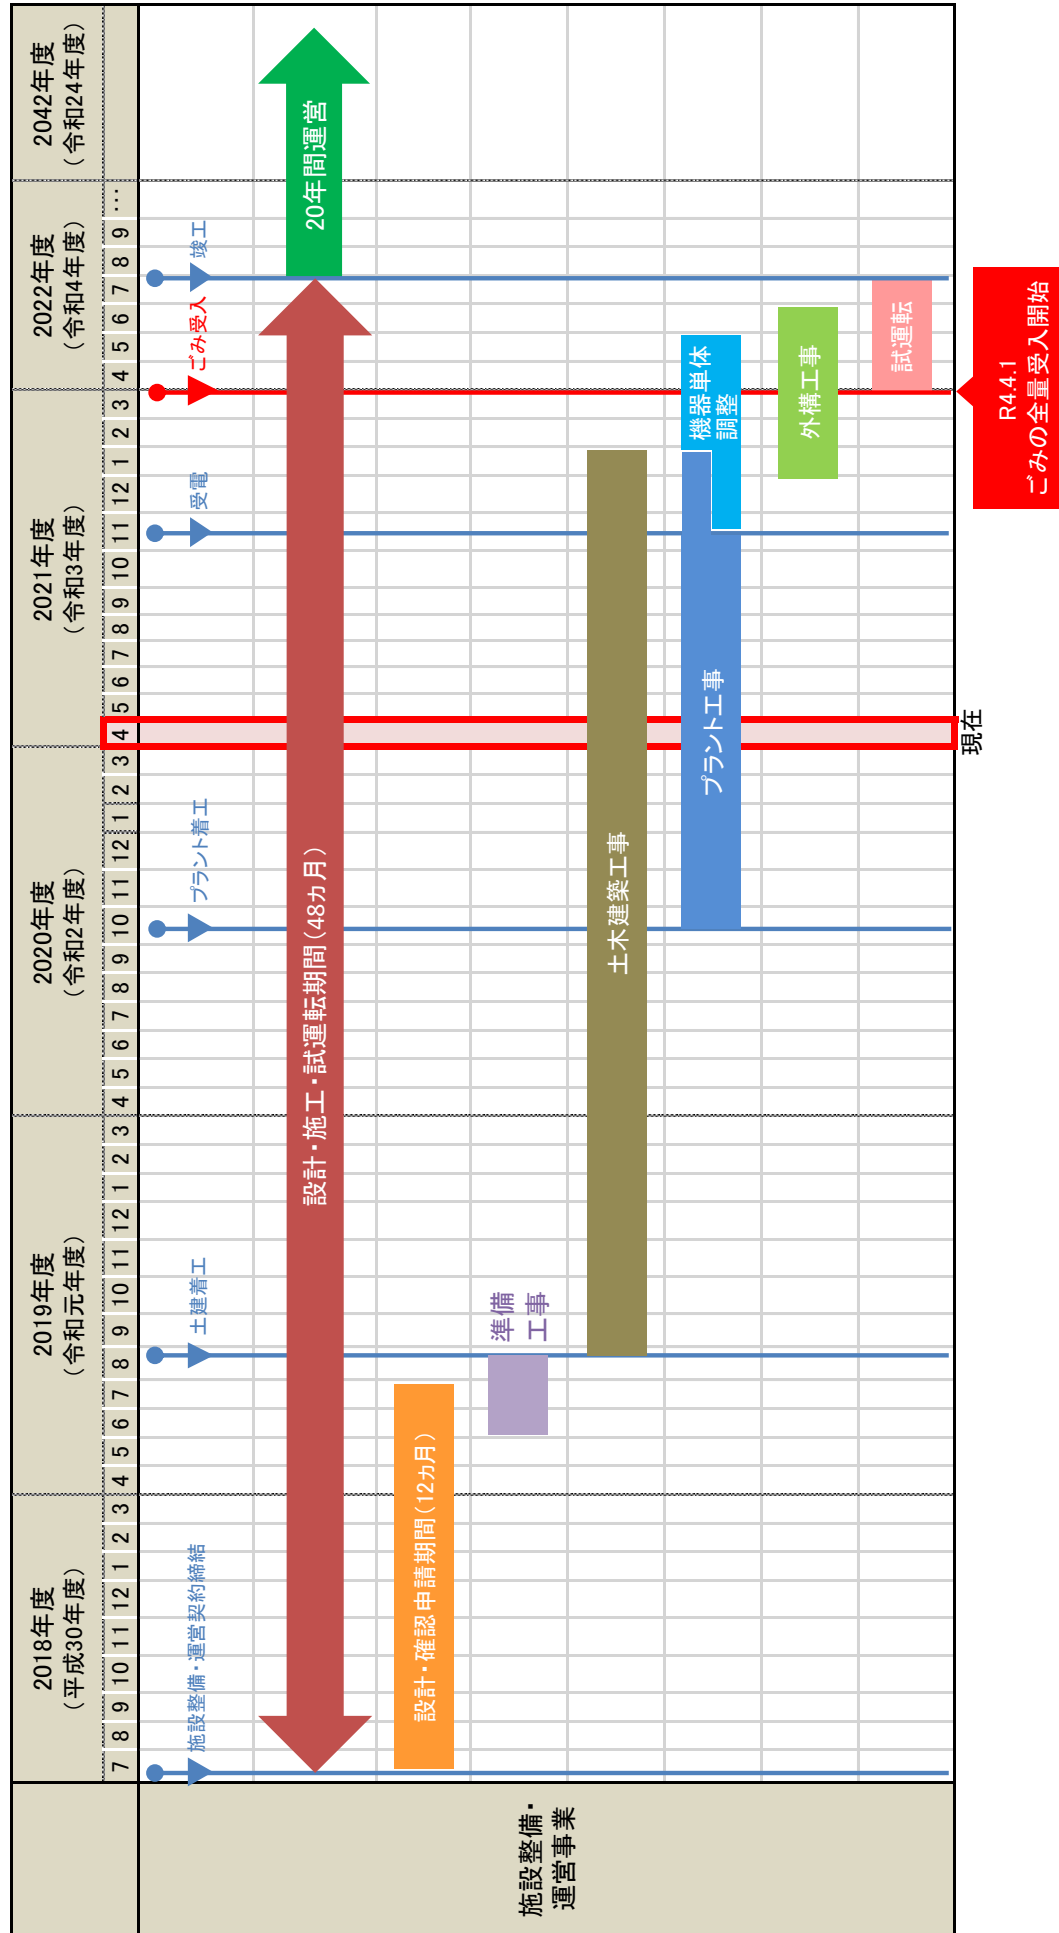

令和3年3月末 工事進捗状況 実績進捗率 47.6%
(予定進捗率 43.7%)
