

## 1 事業内容



- 東部広域の消防庁舎整備基本方針に基づき、令和元年度から事業着手  
 令和元年度：基本設計、地質調査、地盤変動影響調査(事前調査)  
 令和2年度：実施設計、工事着工(工期：令和3年2月10日～令和4年2月15日)
- 令和3年度中に新庁舎を完成(指令系設備の移設を含む。)、同年度中に運用開始予定
- 運用開始後、令和4年度に現庁舎を解体予定

## 2 庁舎概要

- ・敷地面積、地番：2120.72㎡、智頭町大字市瀬字井出口通り、
- ・構造：鉄筋コンクリート造・平屋建
- ・延床面積：650.30㎡(うち、ポンプ室・車いす用駐車場等の附属建物：44.40㎡を含む。)
- ・耐用年数：50年

(受注者)

- 基本、実施設計業務：(有)赤山建築設計事務所
- 庁舎建設工事  
 建築工事：八頭消防署智頭出張所藤原・千代田特定建設  
 工事共同企業体(株)藤原組、(株)千代田工務店
- 電気工事：(株)吉備総合電設
- 機械工事：山陰冷暖設備(株)
- 工事監理業務：(有)尾崎設計

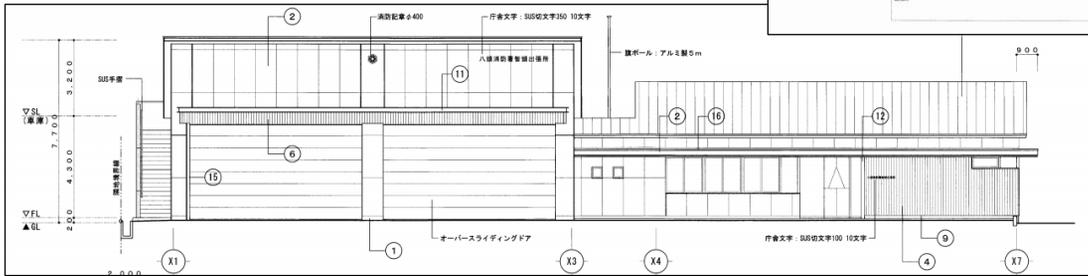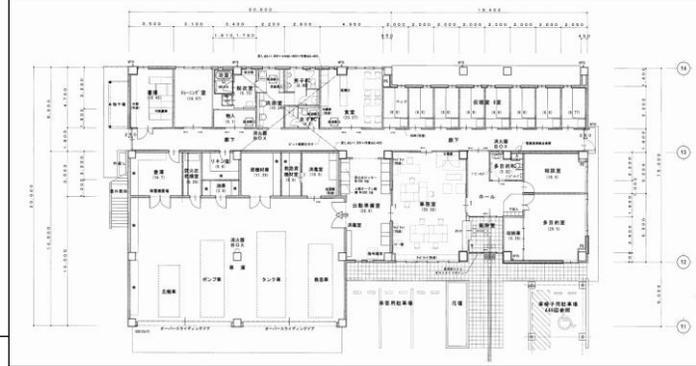

## 3 進捗状況



現在、型枠を外す前の足場が組まれている。

令和3年10月8日現在



(ホースタワーの基礎配筋)

- 9月：型枠解除  
 屋根葺き  
 外部・外構工事  
 ホースタワー着手
- 10月：防水・左官  
 内外装

## 4 その他

- 今後の予定  
 令和4年度に以下の調査、工事を実施予定
  - ・新庁舎竣工後の地盤変動影響調査(事後)
  - ・現庁舎解体工事
  - ・ // 前後の地盤変動影響調査
- 智頭町と敷地排水について最終調整。

# 八頭消防署用瀬出張所整備事業

## 1 事業内容


- 東部広域の消防庁舎整備基本方針に基づき、令和2年度から事業着手  
(実施履歴) 令和2年度：基本・実施設計、地質調査、地盤変動影響調査(事前調査)
- 令和3年10月議会定例会に工事請負契約の締結について諮り、工事着手予定
- 令和4年度中に新庁舎を完成(指令系設備の移設を含む。)、同年度中に運用開始予定
- 運用開始後、令和5年度に現庁舎を解体予定

## 2 庁舎概要

- ・場所：用瀬町保健センター
- ・敷地面積：845m<sup>2</sup>
- ・構造：鉄筋コンクリート造・2階建
- ・延床面積：580.47m<sup>2</sup>(実施設計後の庁舎本体面積)
- ・耐用年数：50年

(受注者)

- 基本、実施設計業務：(株)白兔設計事務所
- 地質調査業務：アイコンヤマト(株)
- 地盤変動影響調査(事前)：(株)白兔設計事務所

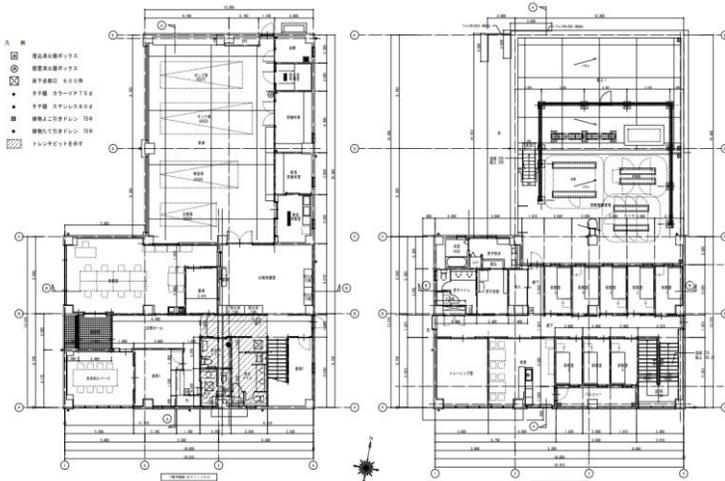

(新庁舎)



## 3 事業費内訳

(単位:千円)

○令和3・4年度の事業費は債務負担行為

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	計
委託料	38,605	3,775	9,272	51,652
工事請負費	0	141,037	222,690	363,727
計	38,605	144,812	231,962	415,379

## 4 その他

○今後の予定

- ・令和3年10月 工事着手  
(工期予定：令和3年10月29日～令和4年9月30日)
- ・鳥取市と消防用地の無償貸付契約の締結

【工程表(予定)】

事業名	令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
用瀬出張所	基本・実施設計業務																							
	基本・実施設計												設計精査											
	建築												解体											
改築工事																								
建築																								
解体																								

# 八頭消防署若桜出張所整備事業

## 1 事業内容

- 東部広域の消防庁舎整備基本方針に基づき、令和3年度から事業着手（予定）
- 令和3年度に基本・実施設計、地質調査を実施
- 令和4年10月議会定例会に工事請負契約の締結について諮り、工事着手予定
- 令和5年度中に新庁舎を完成（指令系設備の移設を含む。）、同年度中に運用開始予定
- 運用開始後、令和6年度に現庁舎を解体予定

## 2 進捗状況

○建設予定地:現在の若桜出張所の隣地(現状:田)



○若桜町:地権者(複数人)と用地取得を調整 ※立木(銀杏栽培)の補償について地権者と調整済  
**令和3年9月から地質・測量設計(造成設計含む)着手**  
 (履行期間:令和4年3月末)

○東部広域:若桜町による用地取得及び造成設計をもって基本・実施設計等に着手  
 令和3年度に基本・実施設計等が実施できないため、工程の変更予定

### 【工程表(変更案)】

事業名	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3
若桜出張所 (当初予定) ↓ (変更案)	基本・実施設計業務																	
	改築工事																	
	解体																	
	基本・実施設計業務																	
	改築工事																	
	解体																	

# 気高消防署整備事業

## 進捗状況

- 鳥取市と建設地の調整中
- 建設地決定次第、設計業務等を予算計上



### 【参考】 庁舎整備計画(抜粋)

署所名	構造	開設年月	経過年	Is値	優先度	整備目標年度
智頭出張所	鉄骨造平屋建	S54.10	42年	0.17	A	R1~3年度
用瀬出張所	鉄骨造平屋建	S54.10	42年	0.10	A	R2~4年度
若桜出張所	鉄骨造平屋建	S54.10	42年	0.25	B	R3~5年度
気高消防署	鉄骨造2階建	S53.10	43年	0.28	B	R4~6年度
国府分遣所	鉄骨造平屋建	S54.10	42年	0.10	B	R5~7年度
吉方出張所	鉄骨造平屋建	S52.4	44年	0.53	B	R6~8年度
