

# 消防庁舎整備事業の進捗状況について

## 1 進捗の概要

【整備完了】 5 施設（対象：9 施設）

事業進捗：55.6%



鳥取消防署東町出張所  
H28.3.24 開設



岩美消防署  
H31.3.28 開設



八頭消防署  
R2.3.17開設



八頭消防署智頭出張所  
R4.3.24 開設




八頭消防署用瀬出張所  
R4.12.8 開設

### 【進行中事業】 2 施設

#### ①八頭消防署若桜出張所

令和4年度から事業着手し、庁舎の設計業務を完了しています。用地取得の手續きに時間を要しているため、用地造成の進捗によっては、建設工事の着工を次年度に繰り越す見込みです。

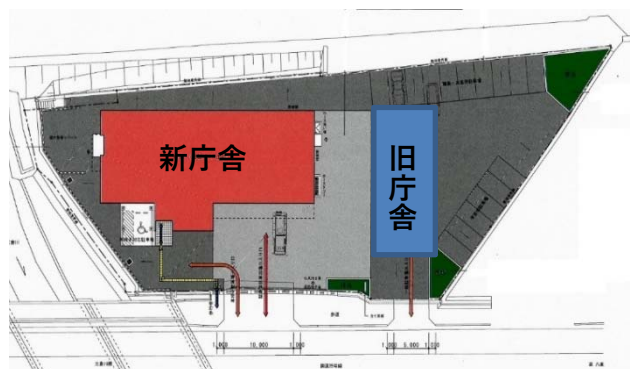

### 消防署整備計画スケジュール

事業名	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			備考										
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	1	2	3	
若桜出張所	基本・実施設計業務																									
	改築工事																									
	建築																									
	解体																									

## ②気高消防署

消防局と鳥取市において、用地について協議を進めており、消防局では設計業務に向け、庁舎の設備等について検討を行っています。

〔移転希望地〕 鳥取市鹿野町乙亥正地内（赤枠の土地）

〔見通し〕 順調に推移すれば、鳥取市により今年度中に用地の売買契約が締結され、造成設計に進む見込み。

- ・ R 5 : 建設予定地協議、移転希望地決定
- ・ R 6 : 基本・実施・解体設計、地質調査
- ・ R 7～8 : 庁舎建設、運用開始
- ・ R 9 : 現庁舎の解体



## 2 今後の方向性

消防庁舎整備基本方針策定後10年が経過しようとしていることや、整備方針にない消防庁舎も耐用年数を迎えるようになることから、基本方針の見直しを行うことも内部で検討を始めています。

現時点の庁舎整備目標年度は、以下のとおりです。

署所名	構造	竣工年月	耐用年数	経過年	Is値	優先度	整備目標年度
八頭消防署若桜出張所	鉄骨造平屋建	S54.9	38年	43年	0.25	B	R4～6年度
気高消防署	鉄骨造2階建	S53.9	38年	44年	0.28	B	R6～8年度
鳥取消防署国府分遣所	鉄骨造平屋建	S54.9	38年	43年	0.10	B	R6～8年度
鳥取消防署吉方出張所	鉄骨造平屋建	S52.3	38年	44年	0.53	B	R7～9年度
気高消防署青谷出張所	鉄骨造平屋建	H2.3	38年	32年	—	C	R8年度以降検討
湖山消防署	鉄筋コンクリート造2階建	S53.3	50年	44年	0.96	C	R8年度以降検討
消防局・鳥取消防署	鉄筋コンクリート造4階建	H1.3	50年	33年	—	C	R8年度以降検討
