

岩美消防署庁舎整備事業について

1. 現況

○建築工事完了:平成31年3月15日(金)

○運用開始:平成31年3月28日(木) 17時から

○工事費 建築 :270,486,000円

電気(発電機工事含む): 66,639,240円

機械 : 55,598,400円

合計 392,723,640円



2. 今年度の動き

○解体及び外構工事を行う。

解体:5月中～下旬に施工業者決定(予定)

外構:7月中～下旬に施工業者決定(予定)

岩美消防署改築(解体・外構)工事計画工程表(案)

工事種別	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考欄	
仮使用期間		仮使用開始							仮使用期間	完成		
解体工事			解体開始		解体完了							
外構工事					外構開始			外構完了				

八頭消防署庁舎整備事業について

1. 契約内容

- 工事名称:八頭消防署改築(建築・電気・機械)工事
- 工 期:平成31年2月8日から令和2年2月14日まで
- 受注者及び契約金額

工種	受注者	契約金額
建築	原田・興洋特定建設工事共同企業体	234,360,000円
電気	株式会社光和電工	66,636,000円
機械	株式会社高千穂	52,812,000円
合計		353,808,000円

2. 現況

○根切り、捨コン打設、基礎配筋を行っている。

- ※ 捨てコンクリート(捨てコンとも言われる)とは、地業後に、基礎や型枠の墨出し、型枠・鉄筋の受け台として設けるものを指す。
- ※ 地業とは、基礎を支えるための、基礎底より下に栗石、割栗石、砕石、杭などを設けた部分のことを指す。



庁舎建設位置



(4月15日現在)

智頭出張所庁舎整備事業について

1. 概要


- 所在地 : 八頭郡智頭町大字市瀬字井手口通り1587-2
- 事業予定期間: 平成31年度～令和3年度 (※ 旧庁舎の解体は令和4年度)
- 建築構造: 鉄筋コンクリート造、平屋若しくは2階建てを想定
- 延べ面積: 約800㎡を想定 (※ 東町出張所: 約851㎡)

【消防用地写真】



【敷地配置図(案)】

庁舎建設部分の敷地面積: 約1,350㎡

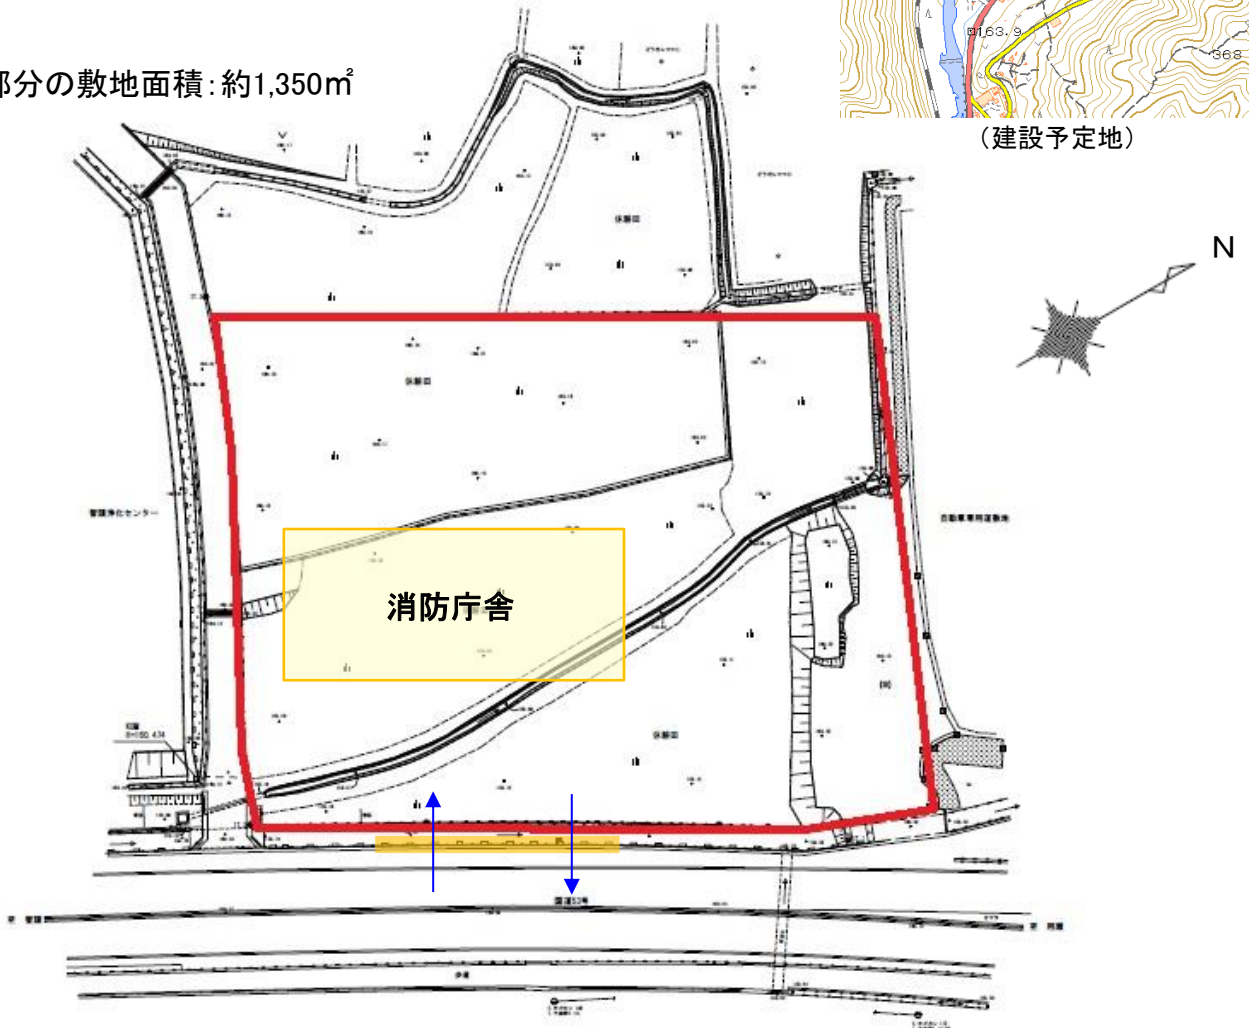

(建設予定地)
