# 八頭消防署庁舎整備事業について

令和2年4月 東部消防局消防総務課

1. 現況

○建築工事完了:**令和2年2月14日**(金)

○運用開始 : **令和2年3月17日**(火) 17時から

○工事費 : 建築 240,171,300円

電気 67,167,300円 機械 53,440,100円

機械 53,440,100円 合計 360,778,700円




(旧庁舎と新庁舎)

- 2. 令和2年度の予定
  - ○**解体及び外構工事**を行う。

業者決定予定:5月中~下旬

#### 八頭消防署改築(解体・外構)工事工程表(案)

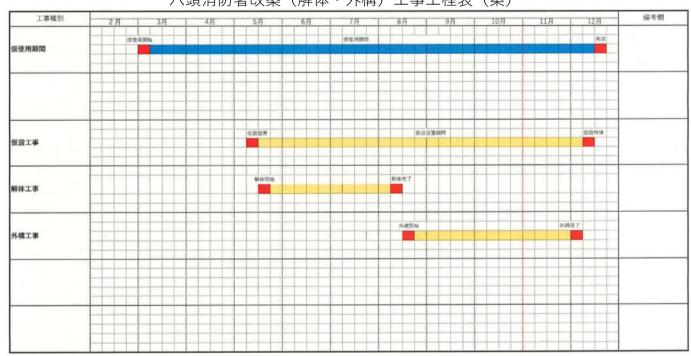

#### 智頭出張所庁舎整備事業について

令和2年4月 東部消防局消防総務課

## 1. 概要

○所在地:八頭郡智頭町大字市瀬字井手口通り1587 - 2

○事業期間 (予定): **令和元年度~令和3年度** (※ 旧庁舎の解体は令和4年度)

○建築構造: 鉄筋コンクリート造平屋建○延べ面積: 657.07㎡ (附属建物を含む)




(造成状況)

## 2. 令和2年度の予定

- ○実施設計を5月末で完了。
- ○今年度、庁舎建設工事に着手。

八頭消防署智頭出張所新築工事工程表(予定)

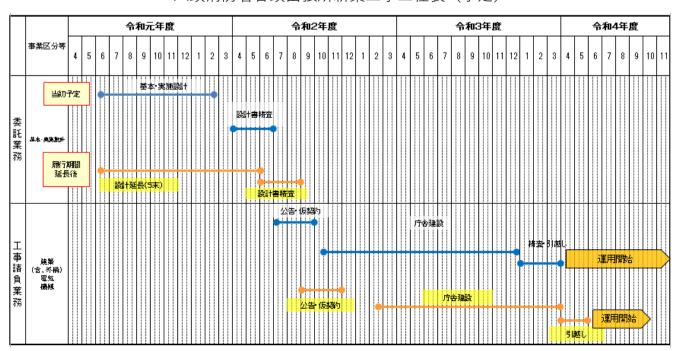

# 用瀬出張所庁舎整備事業について

令和2年4月 東部消防局消防総務課

#### 1. 概要

○所在地:鳥取市用瀬町別府地内(用瀬町総合福祉センター敷地の一部)

○事業期間 (予定):**令和2年~令和4年度** (※ 旧庁舎の解体は令和5年度)

○建築構造: 鉄筋コンクリート造、2階建を想定○延べ面積: 約650㎡を想定 (※ 智頭出張所と同程度)



○建設候補地については、昨年度鳥取市危機管理課及び用瀬町総合支所等と 協議し、地域住民へも説明済である。

#### 2. 令和2年度の予定

○基本・実施設計、地質調査、地盤変動影響調査(事前)を実施。

八頭消防署用瀬出張所新築工事工程 (案)

